


주요 업무 보고

I. 일반현황


1. 연혁 및 기구

□ 연 혁



□ 기 구

3계

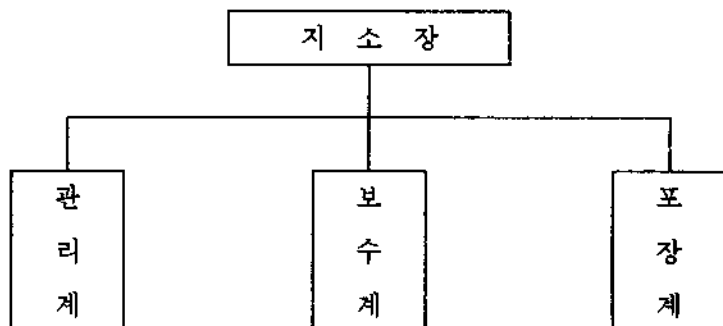

□ 공무원 현황 : 38명(일반 14, 기능 24)

(정원/현원)

(단위 : 명)

구분 \ 직렬	계	일 반					기능직	비 고
		소 계	5 급	6 급	7 급	8 급		
지 소	38/37	14/13	1/1	3/3	4/3	6/6	24/24	

※ 공익요원 5명 근무(일반직 1명 결원)

2. 예산규모

총 28,587백만원

○ 일 반 회 계 : 19,779백만원

○ 이 월 사 업 비 : 8,808백만원

□ 일반회계 _____ 19,779백만원

○ 인건비 및 경상비 _____ 1,243백만원

○ 사 업 비 _____ 18,536백만원

□ 이월사업비 _____ 8,808백만원

○ '95명사이월 _____ 4,068백만원

○ '95사고이월 _____ 4,740백만원

3. 기본현황

□ 공유재산 현황

(단위 : 필지(동), m²)

구 분		필지(동)수	면 적	비 고
계		5	4,474	
지 소	토 지	1	3,590	
	건 물	4	884	

□ 장비보유 현황

(단위 : 대)

용 도 별 보 유 대 수	도로보수	과적단속	장비운반	지원차량
8	4	1	1	2

□ 지방·국지도 및 교량현황

○ 지방도 및 국지도

(단위 : 노선, km)

구 분	노 선 수	총 연 장	포 장 도	비포장도	포 장 륜	비 고
계	26	1,036.4	763.4	273	73.7%	
지 방 도	22	771.9	584.7	187.2	75.7%	
국 지 도	4	264.5	178.7	85.8	67.6%	

○ 교 량

(단위 : 개소, m)


구 분	개 소	연 장	비 고
계	190	10,310	
지 방 도	158	7,865	
국 지 도	32	2,445	

II. '96주요업무

1. 도로관리 기본방향

목 표

- 효율적이고 신속한 도로유지보수
- 교통의 안전성과 쾌적한 환경조성



방 침

- 지방도의 효율적인 유지보수로 원활한 교통소통도모
- 도로구조물보수 및 미관유지로 쾌적한 도로환경조성
- 과적차량단속 강화로 도로 및 구조물파손 사전예방
- 정확하고 신속한 토목시험으로 각종 공사의 부실시공방지

2. '96사업추진 실적

□ 포장도 유지관리

○ 계 획 : 4개사업 9,789백만원(자체사업 7,565, 양여금 2,224)

○ 실 적 : 4개사업 7,150백만원(자체사업 5,897, 양여금 1,253)

○ 진 도 : 73%

○ 세부추진현황

○ 자체사업

(단위 : 개소, 백만원)

구 분 사업별	계 획		실 적		진도 (%)	비고
	사 업 량	사 업 비	사 업 량	사 업 비		
합 계	3개사업	7,565	3개사업	5,897	78	
포장도 유지보수	28	5,488	23	4,442	81	
교통안전시설보수	26	931	21	805	86	
기 타	2	1,146	1	650	50	

○ 양여금사업

(단위 : 개소, 백만원)

구 분 사업별	계 획		실 적		진도 (%)	비고
	사 업 량	사 업 비	사 업 량	사 업 비		
합 계	5	2,224	5	1,253	56	
굴곡부개량	3	1,780	3	809	45	
포장도보수	2	444	2	444	100	

□ 구조물 유지관리

○ 총 사업계획(자체 및 양여금사업) : 30개소 16,797백만원

○ 자체사업 : 25개소 4,827백만원

(단위 : 개소, 백만원)

구 분 사업별	계 획		실 적		비 고
	사 업 량	사 업 비	사 업 량	사 업 비	
계	25	4,827	24	4,219	
재 가 설	2	1,700	2	1,494	
폐교량철거	10	380	8	146	
교량안전진단	8	248	9	217	
이 월 사 업 (재가설)	5	2,499	5	2,362	

○ 양여금사업 : 5개소 11,970백만원

(단위 : 개소, 백만원)

교량명	위 치	사 업 량	사업비	사 업 기 간	공정 (%)	비 고
계			11,970			
대전1교	연천·청산·대전	L=20m B=11m	237	'96. 8. 16 ~'97. 2. 11	45	'96신규
대전2교	"	L=22m B=11m	294	'96. 8. 6 ~'97. 1. 27	35	"
대전교	"	L=90m B=11m	1,465	'95. 9. 26 ~'96. 12. 23	80	'95이월
교하교	과주·교하·교하	L=210m B= 20m	5,496	'94. 7. 15 ~'96. 11. 30	92	'94계속
임월교	과주·문산·내포	L=200m B= 12m	4,478	'94. 11. 16 ~'96. 12. 31	63	"

□ 사리도 유지관리

○ 사업계획 : 22개 노선 72.5km, 95백만원

○ 추진현황

(단위 : km, 백만원)

구 분 사업별	계 획		실 적		비 고
	사 업 량	사 업 비	사 업 량	사 업 비	
계	72.5	95	17.4	35	
사 리 부 설	72.5	85	17.4	32	
노 면 정 리		10		3	

□ 과적차량 단속

○ 단속반 편성 : 2개반 14명(일반 9, 공익근무요원 5)

○ 추진실적

(단위 : 대)

구 분	단속횟수	검차대수	정 상	처 리 현 황			
				계	고 발	사전송치	타기관이송
계	418	37,529	37,391	138	66	55	17

※ 벌칙규정 : 도로법 제83조

(차주, 운전자, 화주 각 1년이하의 징역 또는 200만원이하의 벌금)

3. 지방도 수해복구 추진

- '96. 7. 26~7. 28 기간중 경기북부지역에 내린 집중호우로 유실된 도로 및 교량의 신속한 복구추진으로 재해재발 방지 및 교통편익 도모

□ 수해 및 복구소요액

○ 피해내용

○ 총 : 42개소 10,237m 6,367백만원

— 도 로 : 38개소 9,924m 1,515백만원

— 교 량 : 4개소 313m 4,752백만원

○ 소요예산 확보액 : 3,736백만원(도로 1,533, 교량 2,203)

○ 소요예산 미확보액 : 2,631백만원(도로 82, 교량 2,549)

○ 부족사업비 조치계획

○ 도로복구비 82백만원은 '96기동보수예산으로 긴급복구

○ 교량복구비 2,549백만원은 '97예산확보 추진

□ 그동안 추진사항

○ 복 구 완 료 : 2개소(도로 2)

○ 복 구 중 : 39개소(도로 36, 교량 3)

○ 발주준비중 : 1개소(교량 1)

※ '96. 11. 15 설계완료, '96. 12월 공사착공예정

□ 향후 추진계획

○ '96. 12월 완료예정 : 14개소(도로 11, 교량 3)

○ '97. 5월 완료예정 : 25개소(도로 25)

○ '97이후 완료예정 : 1개소(교량 1)

4. 동절기 설해 예방 대책

○ 동절기 설해로 인한 각종 재해를 사전에 예방, 주민의 생명과 재산보호

○ 피해의 조기수습과 교통소통 원활을 도모하고 주민참여 유도로서 자율 방재의식 제고

□ 일반현황

- 인 원 : 37명(도, 시·군지원 및 유관기관 협조체제 유지)
- 대상도로 : 26개노선 1,036.4km(포장도 763.4km, 사리도 273km)
- 장 바 : 적설장비 24대
- 설해위험지역 : 28개 구간
- 위험지역노선 적사함 설치완료(전노선) : 357개소 1,193m³

□ 추진계획

- 추진기간 : '96. 12. 1 ~ '97. 3. 15
- 대상도로 : 한수이북 지방도로 전역
- 우선순위 : 교통량 및 지역여건 등 중요도에 따라 중점관리
- 비상근무반 편성운영
 - 평상시 : 야간 당직제 운영
 - 강설시 : 적설량에 따라 1, 2, 3단계 비상근무 실시

<부 록>

간 부 명 단

직 위	직 급	성 명	생 년 월 일	비 고
지 소 장	지방토목사무관	안 전 모	'51. 1. 16	
관 리 계 장	지방행정주사	이 재 영	'61. 4. 8	
보 수 계 장	지방토목주사	윤 형 권	'56. 5. 4	
포 장 계 장	지방토목주사	변 영 섭	'61. 12. 11	
